ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Ермакова Роща ул., д.1, стр.1, Москва, 123290
Телефон: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770301001

29.09.2026 Исх-23173/26

Автономная некоммерческая
организация по развитию
городской среды
«ОЭК Стройтрест»

Департамент капитального
ремонта города Москвы

В соответствии с письмом от 25.08.2026 № ОЭКСТ/01/4940 (далее – Письмо) Департамент образования и науки города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел предложение об изменении проектных решений в части устройства фрамуг в оконных блоках на объекте капитального ремонта «ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14» (далее – Объект) и сообщает о возможности реализации проектных решений по второму варианту: устройство фрамуги в верхней части оконного блока с установкой ручки на высоте 1600-1700 мм от уровня чистого пола.

Дополнительно Департамент информирует о том, что в Письме, проектной документации раздела «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» (письмо от 13.08.2026 № ОЭКСТ/01/4761), альбоме «Концепция фасадов и входных групп» (письмо от 03.07.2026 № ОЭКСТ/01/4025) отметки низа окон от уровня чистого пола не соответствуют фактическим отметкам (Приложение 1).

Департамент сообщает о необходимости внести изменения в части отметок низа окон в проектную документацию в строгом соответствии с фактическими отметками по существующему положению, а также привести проектную документацию в соответствие со Стандартом «Московская школа. Модернизация объектов образования» и Технологическим заданием № 2/28-1077 на проектирование и капитальный ремонт Объекта и представить ее для повторного рассмотрения.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя **Е.А. Чугарина**

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0091620D7043609FE8C8065BB20040AF76
Владелец: Чугарина Елена Александровна
Действителен с 02-12-2025 до 25-02-2027

Е.В. Круглик
8-495-633-46-34

Вх. № 01/7841 от 29.09.2026

Вариант 1 (уменьшение нижней фрамуги до 380 мм)

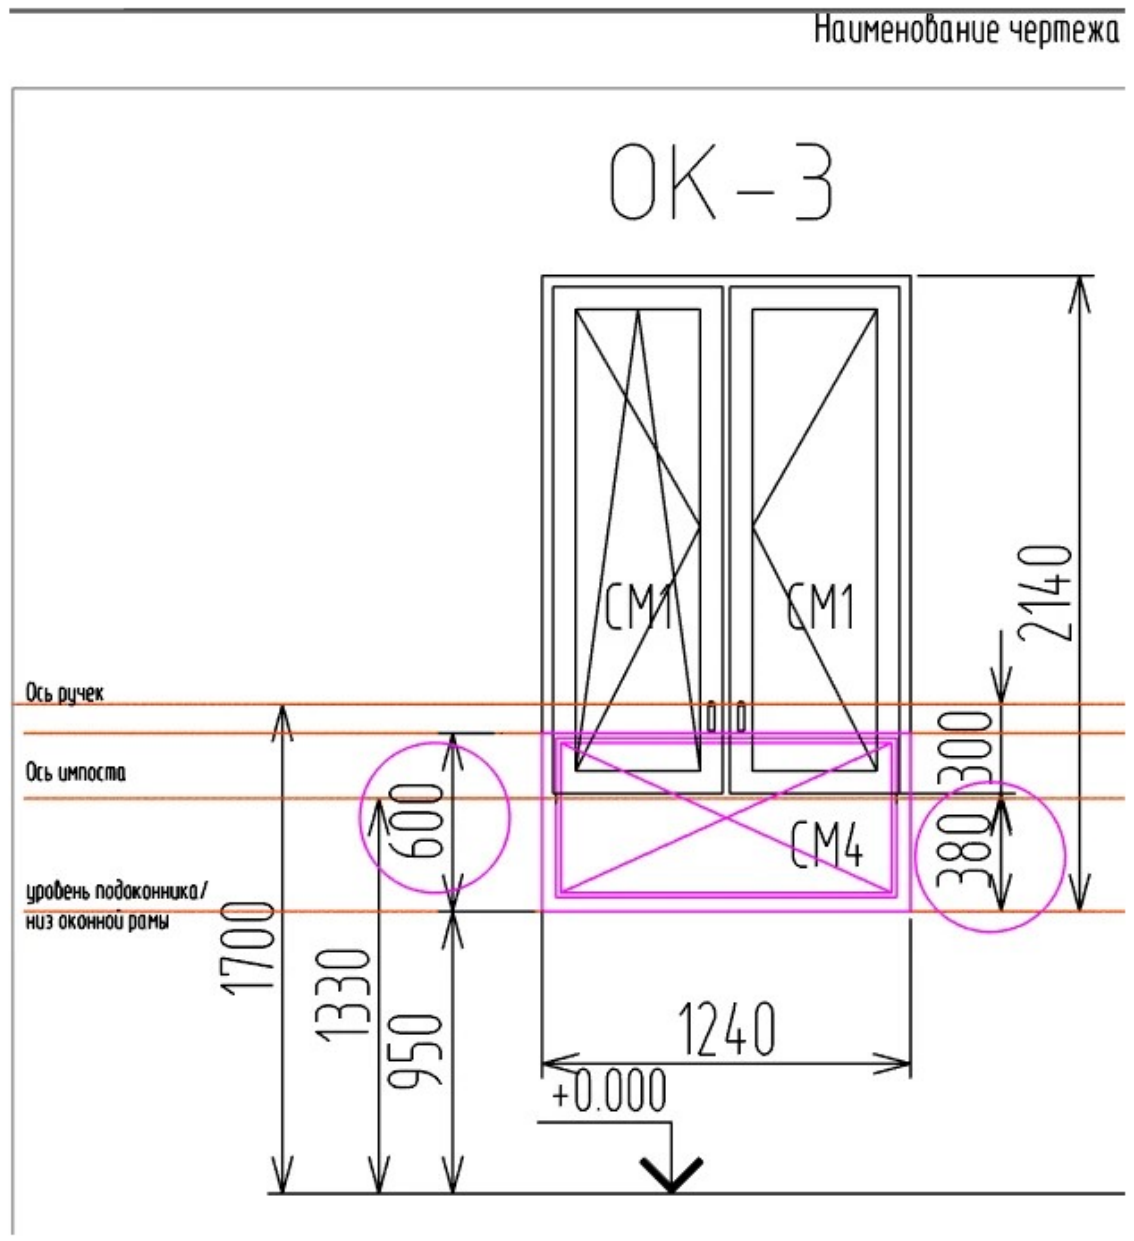

Вариант 2 (перенос фрамуги в верхнюю часть окна)

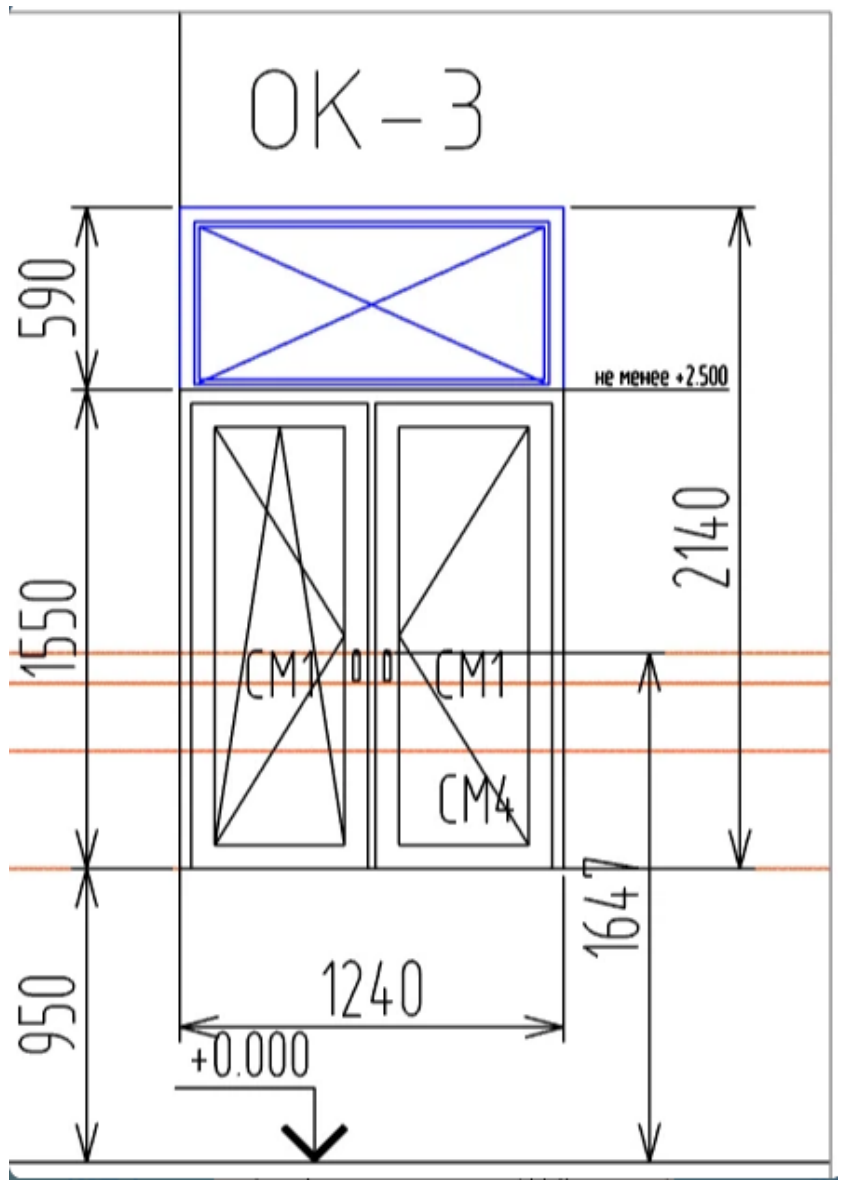

Фотофиксация объекта

Формат: 594x841

Разрез 4-4. М1:100

Фасадная композиционная система "Vetonit"	
с наружным штукатурным слоем с покраской в 2 слоя силикатной краской	- 2мм
Устройство антивандального базового слоя выше уровня цоколя на всю высоту	
усиленного щелочестойкой панцирной защитной сеткой в 2 слоя.	
Утеплитель- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад,	
(плотностью -105 кг/м³)	- 150 мм
Клеевой состав	- 10мм
Существующая стена и полнотелого керамического кирпича	

Ходовой настил из тротуарной плитки 500x500x40 мм

Наплавляемые битумно-полимерные материалы в 2 слоя (верхний слой с крупнозернистой посыпкой)	
Армированная цементно-песчаная стяжка М150 с сеткой ø5 Вр1 шаг 50x50, 1800 кг/м3	-50 мм
Керамзитовый гравий 400 кг/м3 по уклону (фракции 20- 40 мм), пропитанный цементным молочком	- 50-400 мм
Разделительный слой	
Минераловатная плита (верхний слой), плотность 110 кг/м3	- 50 мм
Минераловатная плита (нижний слой), плотность 105 кг/м3	- 150 мм
Пароизоляция	
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м3	- 50мм
Существующая сборная ж/б плита перекрытия	

Керамогранитная плитка 600x600мм на клею	-20мм
Ц.п штукатурка по тканной металлической сетке d-0.8мм с ячейкой 14x14мм	-60мм
Пеностекло, p=120кг/м³, λ=0.042Вт/м°С на 300мм от ур.земли	-150 мм
Гидроизоляция битумно-полимерная	2 слоя
Праймер битумный	
Существующая стена из полнотелого керамического кирпича	

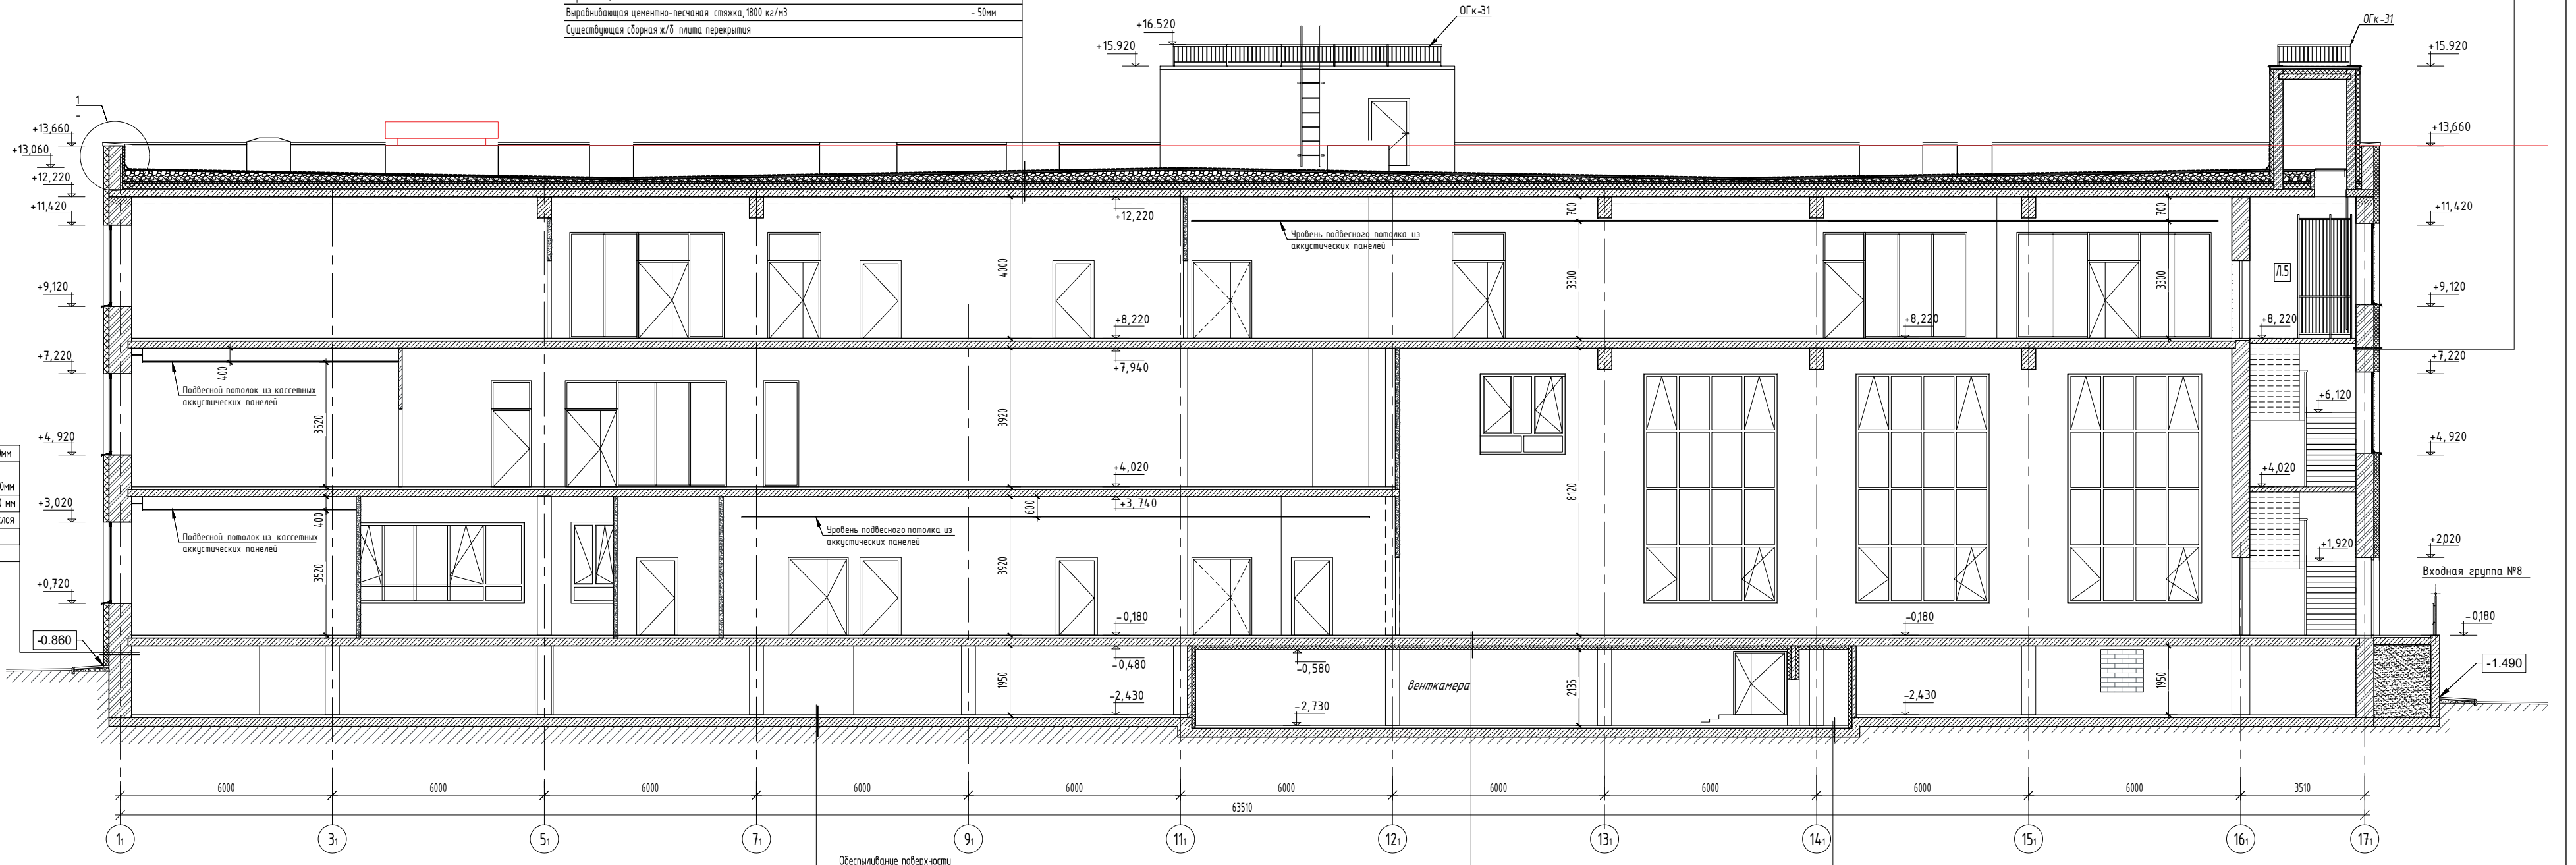

Обеспыливание поверхности
Ц.п. стяжка 80мм
Ж/Б плита основания

Чистовая отделка пола	- 10мм
Конструкция пола	- 70мм
Существующее перекрытие	- 220мм
Звукоизоляция НГ, p=120кг/м³, λ=0.041Вт/м°С	-100мм
Каркас из оцинкованных профилей с облицовкой из ГКЛВ	- 100мм

Керамогранит на клею	-20 мм
Грунтовка	
Цементно-песчаная стяжка М150	-60мм
Гидроизоляция 2 слоя, с заведением на стену на 300мм	
Ж/Б плита основания	

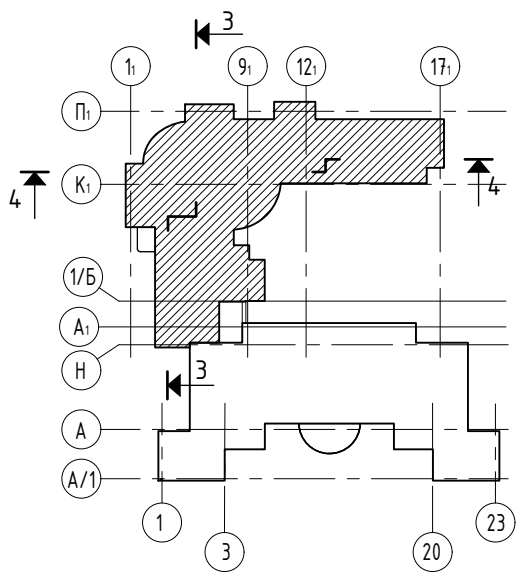

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуритановым герметиком , между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла толщиной 150мм и высотой 300мм примыкает к верху отмостки.
4. Утеплены оба корпуса минераловатными плитами толщиной 150мм
5. Утеплитель из пеностекла от уровня отмостки на высоту 300мм.

0,000=156.92

						16- 25/Г-Р-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата				
Разраб.		Липавская Е.В.			2026.08.04	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
					2026.08.04		Р	17	
Н. контр.		Губарева Е.В.				Разрез 4-4. М1:100	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			2026.08.04				

ФОРМАТ 01

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подписал: Кохнович Олег Владиславович (Администрация
Управляющий)
